MODELO DE NEGOCIO

Prefactibilidad de 10 PCH

Pequeñas centrales hidroeléctricas: etapas, compuertas de decisión y sociedad por proyecto

CLIENTE INVERSIONISTA

Regenergy Projects SAS · Cali, Colombia

19 de octubre de 2026

WhatsApp +57 305 421 2200

gerencia@regenergy-pro.com

MODELO DE NEGOCIO

Resumen del modelo

ALCANCE

10

sitios de PCH

de la cartera de 75 sitios de Regenergy, con prefactibilidad en dos etapas.

PROCESO

2

etapas

con 2 compuertas de decisión: solo avanzan los sitios que cumplen los criterios.

MODELO

SAS

por proyecto

con el Cliente y Regenergy como socios en cada sitio que califica.

Desde la firma, Regenergy reserva los sitios contratados para el Cliente, y el Cliente decide en cada compuerta si continúa.

PROCESO

Etapas y compuertas de decisión

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

Etapa 1
Filtro de gabinete
10 sitios

→

Compuerta 1

→

Etapa 2
Prefactibilidad con campo
Sitios activados

DESPUÉS DEL ESTUDIO

→

Compuerta 2

→

SAS
Una por proyecto; Cliente y Regenergy son socios

Semanas 1 a 8
Compromiso firme

Semanas 9 a 10
Decide el Cliente en 10 días hábiles

Semanas 11 a 22
Si el Cliente la activa (estimado: 4 sitios)

Semanas 23 a 39
Preferencia del Cliente en [90] días

Constitución en [30] días
El Cliente financia las fases siguientes

ALCANCE

Alcance técnico de cada etapa

Etapa 1

Filtro de gabinete

10 sitios

- **Hidrología**
- **Caída y obras**
- **Potencia y energía**
- **Conexión**
- **Ambiental y predial**
- **Costos y finanzas**

Modelo de elevación de 0,5 m de UP42 Vivid Terrain

ENTREGABLES

- Informe de filtro con ranking de los 10 sitios
- Ficha por sitio
- Libro de cálculo (Excel)
- Recomendación de sitios para la Etapa 2

Etapa 2

Prefactibilidad con campo

Estimado: 4 sitios

- Visita de reconocimiento de 2 días
- Validación de la caída con GNSS/RTK (topógrafo subcontratado)
- Gestiones con la CAR, el operador de red y los propietarios
- Informe por sitio firmado por un ingeniero con matrícula

ENTREGABLES

- Informes por sitio (PDF)
- Modelo financiero (Excel)
- Datos geoespaciales (KMZ)
- Informe consolidado, presentación al comité y propuesta de términos de la SAS

DECISIÓN

Criterios de las compuertas

Criterio	Compuerta 1: pasa a campo	Compuerta 2: pasa a la SAS
Potencia	Estimada de al menos [1 MW]	Recalculada con la caída validada, a menos de [15 %] de la estimada
TIR y capex	TIR sin financiación de al menos [12 %]; capex por kW dentro de un máximo [a definir]	TIR de al menos [12 %] en el caso base y [8 %] en el conservador (caudal −15 %, capex +20 %); capex por kW dentro de un máximo [a definir]
Conexión	Punto probable a máximo [15 km]	Sin restricción de capacidad informada por el operador de red
Ambiental y predial	Sin traslape con áreas protegidas, páramos u otras figuras de exclusión; tenencia clara o gestionable	Sin impedimento mayor informado por la CAR; al menos un contacto positivo con los propietarios
Decisión del Cliente	En 10 días hábiles; sin respuesta, el sitio no se activa y queda libre para Regenergy	En [90] días desde el informe del sitio; la SAS se constituye en los [30] días siguientes

Los umbrales entre corchetes son propuestos y se ajustan con el Cliente.

MODELO DE NEGOCIO

Sociedad por proyecto (SAS)

Participación

- Una SAS propia por cada sitio que califica en la Compuerta 2.
- Regenergy aporta el sitio, los estudios, la metodología y las horas no facturadas; el Cliente, el estudio que pagó y el capital.
- Porcentajes por definir en el acuerdo de accionistas.
- La participación de Regenergy no se diluye hasta obtener licencia ambiental, concesión de aguas y concepto de conexión.

Desarrollo

- El Cliente financia el presupuesto aprobado por la junta, como capital o préstamo de socio.
- Regenergy gerencia predios, licencia, concesión, conexión y contratación.
- Regenergy cobra a la SAS un honorario, mensual o por hitos, y se le reembolsan los gastos adelantados.


Gobierno

- Junta con representación proporcional.
- Mayoría calificada para presupuestos, endeudamiento, venta de activos y cambios de estructura.
- Preferencia, tag-along y drag-along.
- Términos indicativos hasta firmar el acuerdo de accionistas, redactado por un abogado.

MODELO DE NEGOCIO

Hoja de ruta del proyecto

FRENTES EN PARALELO · DURACIÓN

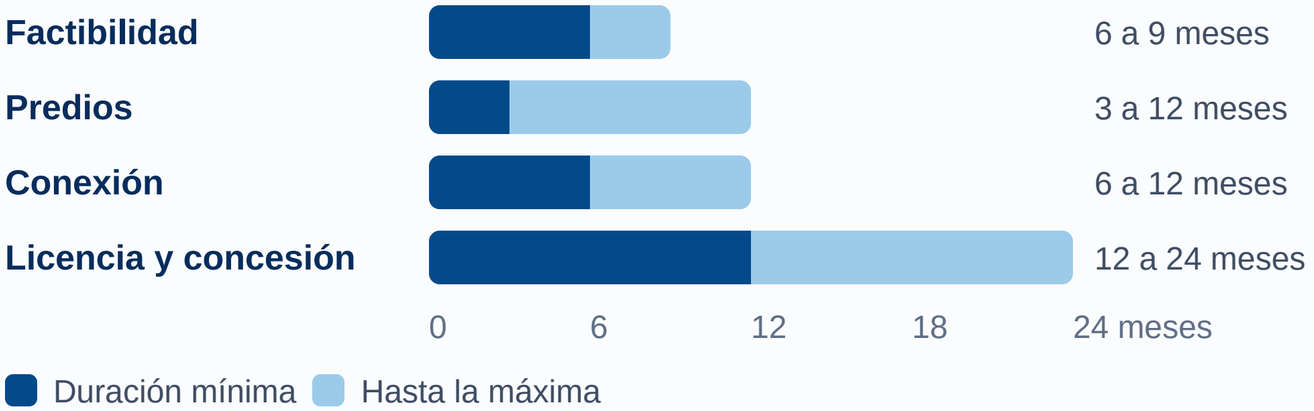

La factibilidad incluye aforos continuos, topografía y geotecnia.

DESPUÉS

Diseños, PPA y financiación

6 a 12 meses

FINAL

Construcción

Solo cuando todo está listo

En total, suelen pasar de 3 a 7 años.

WhatsApp +57 305 421 2200

gerencia@regenergy-pro.com

CIERRE

Reglas del modelo y próximos pasos

REGLAS DEL MODELO

Protección de las partes

Reserva. Los sitios contratados no se ofrecen a terceros desde la firma y hasta [90] días después de cada informe.

Confidencialidad. [5] años sobre sitios, estudios y condiciones; antes del acuerdo marco solo se ven códigos.

Propiedad intelectual. Cartera, metodología y modelos son de Regenergy; el Cliente usa los informes de los sitios que pagó.

No elusión. Durante [5] años el Cliente no contacta ni desarrolla los sitios contratados sin Regenergy.

Las cifras entre corchetes son propuestas y se ajustan con el Cliente.

PRÓXIMOS PASOS

1. **Firmar el acuerdo marco**
   Se firma antes de recibir coordenadas exactas o informes.
2. **Enviar sus criterios de inversión**
   TIR objetivo y rango de tamaño, en 5 días hábiles después de la firma.
3. **Iniciar el estudio por etapas**
   Etapa 1 en 8 semanas; el Cliente decide en cada compuerta.

WhatsApp +57 305 421 2200
gerencia@regenergy-pro.com
