MODELO DE NEGOCIO

Prefactibilidad de 10 PCH

Pequeñas centrales hidroeléctricas: etapas, compuertas de decisión y sociedad por proyecto

CLIENTE INVERSIONISTA

Regenergy Projects SAS · Cali, Colombia

19 de octubre de 2026

MODELO DE NEGOCIO

Resumen del modelo

ALCANCE

10

sitios de PCH

de la cartera de 75 sitios de Regenergy, con prefactibilidad en dos etapas.

PROCESO

2

etapas

con 2 compuertas de decisión: solo avanzan los sitios que cumplen los criterios.

MODELO

SAS

por proyecto

con el Cliente y Regenergy como socios en cada sitio que califica.


Desde la firma, Regenergy reserva los sitios contratados para el Cliente, y el Cliente decide en cada compuerta si continúa.

PROCESO

Etapas y compuertas de decisión

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

DESPUÉS DEL ESTUDIO

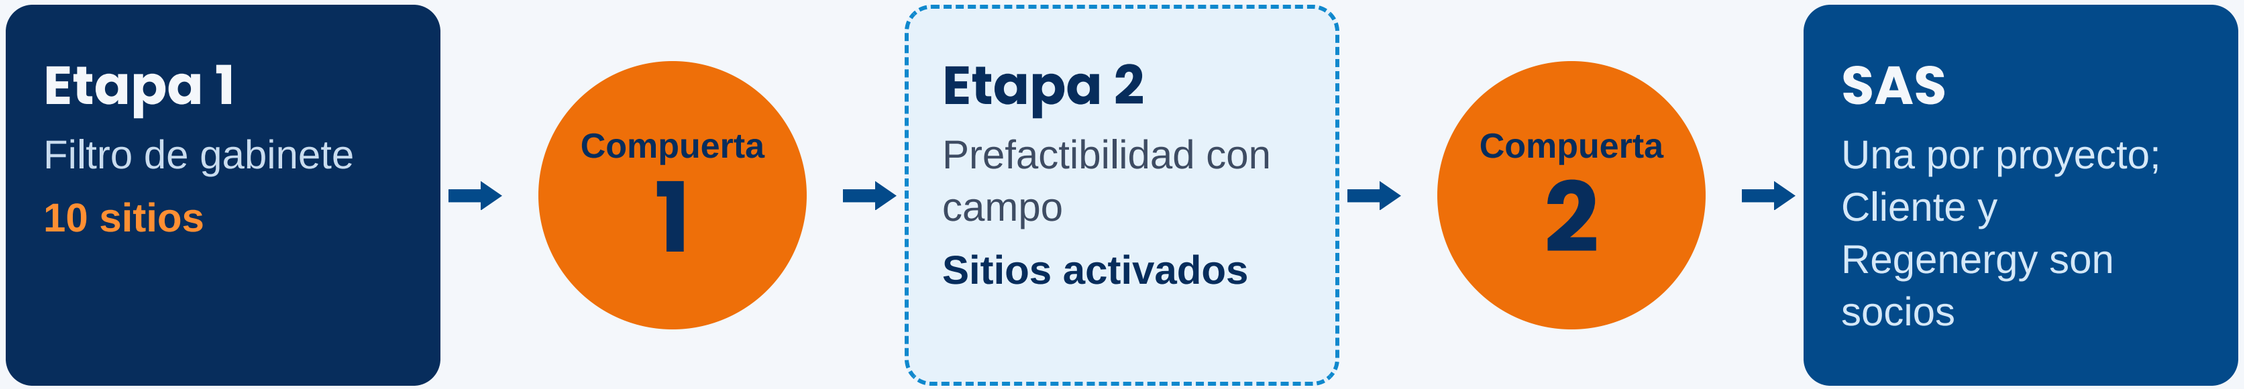

Semanas 1 a 8
Compromiso firme

Semanas 9 a 10
Decide el Cliente en 10 días hábiles

Semanas 11 a 22
Si el Cliente la activa (estimado: 4 sitios)

Semanas 23 a 39
Preferencia del Cliente en [90] días

Constitución en [30] días
El Cliente financia las fases siguientes

ALCANCE

Alcance técnico de cada etapa

Etapa 1

Filtro de gabinete

10 sitios

- **Hidrología**
- **Caída y obras**
- **Potencia y energía**
- **Conexión**
- **Ambiental y predial**
- **Costos y finanzas**

Modelo de elevación de 0,5 m de UP42 Vivid Terrain

ENTREGABLES

- Informe de filtro con ranking de los 10 sitios
- Ficha por sitio
- Libro de cálculo (Excel)
- Recomendación de sitios para la Etapa 2

Etapa 2

Prefactibilidad con campo

Estimado: 4 sitios

- Visita de reconocimiento de 2 días
- Validación de la caída con GNSS/RTK (topógrafo subcontratado)
- Gestiones con la CAR, el operador de red y los propietarios
- Informe por sitio firmado por un ingeniero con matrícula

ENTREGABLES

- Informes por sitio (PDF)
- Modelo financiero (Excel)
- Datos geoespaciales (KMZ)
- Informe consolidado, presentación al comité y propuesta de términos de la SAS

DECISIÓN

Criterios de las compuertas

Criterio	Compuerta 1: pasa a campo	Compuerta 2: pasa a la SAS
Potencia	Estimada de al menos [1 MW]	Recalculada con la caída validada, a menos de [15 %] de la estimada
TIR y capex	TIR sin financiación de al menos [12 %]; capex por kW dentro de un máximo [a definir]	TIR de al menos [12 %] en el caso base y [8 %] en el conservador (caudal −15 %, capex +20 %); capex por kW dentro de un máximo [a definir]
Conexión	Punto probable a máximo [15 km]	Sin restricción de capacidad informada por el operador de red
Ambiental y predial	Sin traslape con áreas protegidas, páramos u otras figuras de exclusión; tenencia clara o gestionable	Sin impedimento mayor informado por la CAR; al menos un contacto positivo con los propietarios
Decisión del Cliente	En 10 días hábiles; sin respuesta, el sitio no se activa y queda libre para Regenergy	En [90] días desde el informe del sitio; la SAS se constituye en los [30] días siguientes

Los umbrales entre corchetes son propuestos y se ajustan con el Cliente.

MODELO DE NEGOCIO

Sociedad por proyecto (SAS)

Participación

- Una SAS propia por cada sitio que califica en la Compuerta 2.
- Regenergy aporta el sitio, los estudios, la metodología y las horas no facturadas; el Cliente, el estudio que pagó y el capital.
- Porcentajes por definir en el acuerdo de accionistas.
- La participación de Regenergy no se diluye hasta obtener licencia ambiental, concesión de aguas y concepto de conexión.

Desarrollo

- El Cliente financia el presupuesto aprobado por la junta, como capital o préstamo de socio.
- Regenergy gerencia predios, licencia, concesión, conexión y contratación.
- Regenergy cobra a la SAS un honorario, mensual o por hitos, y se le reembolsan los gastos adelantados.


Gobierno

- Junta con representación proporcional.
- Mayoría calificada para presupuestos, endeudamiento, venta de activos y cambios de estructura.
- Preferencia, tag-along y drag-along.
- Términos indicativos hasta firmar el acuerdo de accionistas, redactado por un abogado.

MODELO DE NEGOCIO

Hoja de ruta del proyecto

FRENTES EN PARALELO · DURACIÓN

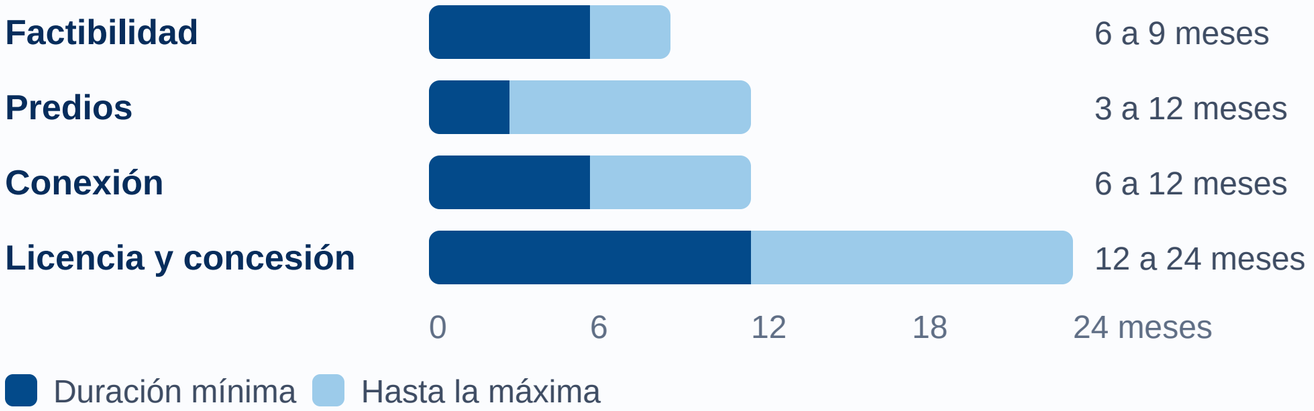

La factibilidad incluye aforos continuos, topografía y geotecnia.

DESPUÉS

Diseños, PPA y financiación

6 a 12 meses

FINAL

Construcción

Solo cuando todo está listo

En total, suelen pasar de 3 a 7 años.

CIERRE

Reglas del modelo y próximos pasos

REGLAS DEL MODELO

Protección de las partes

Reserva. Los sitios contratados no se ofrecen a terceros desde la firma y hasta [90] días después de cada informe.

Confidencialidad. [5] años sobre sitios, estudios y condiciones; antes del acuerdo marco solo se ven códigos.

Propiedad intelectual. Cartera, metodología y modelos son de Regenergy; el Cliente usa los informes de los sitios que pagó.

No elusión. Durante [5] años el Cliente no contacta ni desarrolla los sitios contratados sin Regenergy.

Las cifras entre corchetes son propuestas y se ajustan con el Cliente.

PRÓXIMOS PASOS

1 **Firmar el acuerdo marco**
Se firma antes de recibir coordenadas exactas o informes.

2 **Enviar sus criterios de inversión**
TIR objetivo y rango de tamaño, en 5 días hábiles después de la firma.

3 **Iniciar el estudio por etapas**
Etapa 1 en 8 semanas; el Cliente decide en cada compuerta.

gerencia@regenergy-pro.com · +57 305 421 2200
