PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Prefactibilidad de 10 PCH

Pequeñas centrales hidroeléctricas, en dos etapas con compuertas de decisión

Regenergy Projects SAS · Cali, Colombia

19 de octubre de 2026 · Preparada para EGyT

PRECIOS TENTATIVOS · POR VERIFICAR

PROPUESTA

Resumen de la propuesta

ALCANCE

10

sitios de PCH

de la cartera de 75 sitios de Regenergy, con prefactibilidad en dos etapas.

PROCESO

2

etapas

con 2 compuertas de decisión: solo avanzan los sitios que cumplen los criterios.

INVERSIÓN · TENTATIVA

305,8

millones de COP

valor base estimado antes de IVA, por verificar; COP 187 millones son compromiso firme.


Los sitios viables pasan a una sociedad por acciones simplificada (SAS) por proyecto, con EGyT y Regenergy como socios.

PROCESO

Etapas y compuertas de decisión

ALCANCE Y PRECIO DE ESTA PROPUESTA

DESPUÉS DEL ESTUDIO

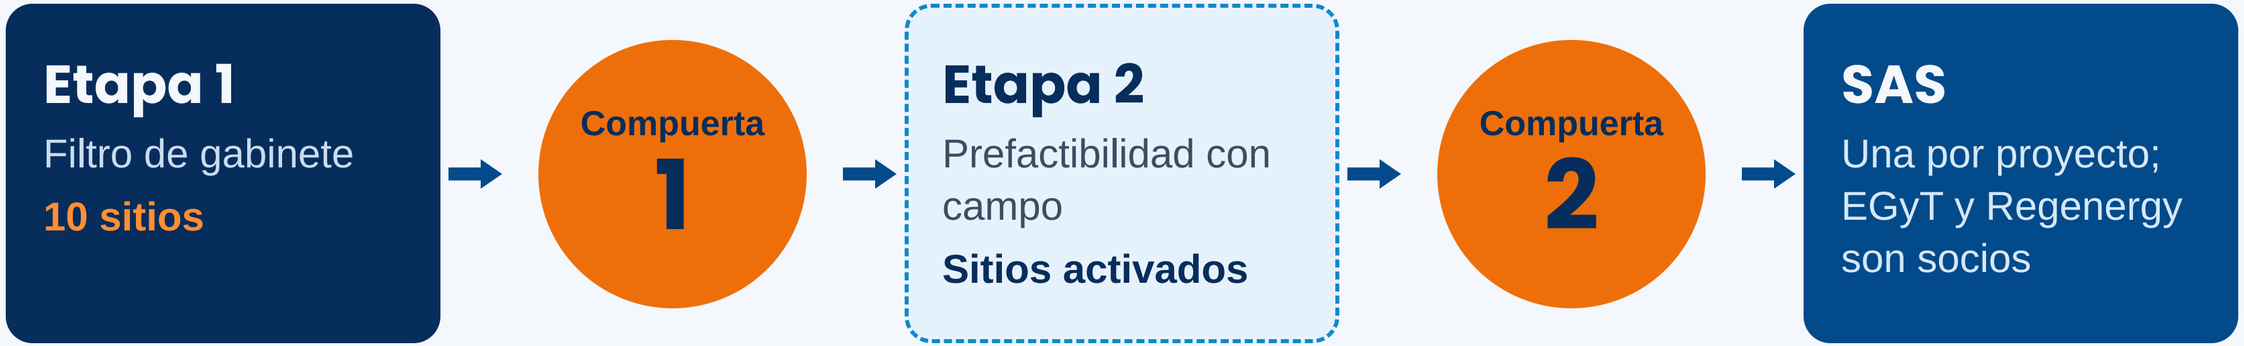

Semanas 1 a 8
Compromiso firme

Semanas 9 a 10
Decide EGyT en 10 días hábiles

Semanas 11 a 22
Si EGyT la activa (estimado: 4 sitios)

Semanas 23 a 39
Preferencia de EGyT en [90] días

Constitución en [30] días
EGyT financia las fases siguientes

ALCANCE

Alcance técnico de cada etapa

Etapa 1

Filtro de gabinete

10 sitios

- **Hidrología**
- **Caída y obras**
- **Potencia y energía**
- **Conexión**
- **Ambiental y predial**
- **Costos y finanzas**

Modelo de elevación de 0,5 m de UP42 Vivid Terrain

ENTREGABLES

- Informe de filtro con ranking de los 10 sitios
- Ficha por sitio
- Libro de cálculo (Excel)
- Recomendación de sitios para la Etapa 2

Etapa 2

Prefactibilidad con campo

Estimado: 4 sitios

- Visita de reconocimiento de 2 días
- Validación de la caída con GNSS/RTK (topógrafo subcontratado)
- Gestiones con la CAR, el operador de red y los propietarios
- Informe por sitio firmado por un ingeniero con matrícula

ENTREGABLES

- Informes por sitio (PDF)
- Modelo financiero (Excel)
- Datos geoespaciales (KMZ)
- Informe consolidado, presentación al comité y propuesta de términos de la SAS

DECISIÓN

Criterios de las compuertas

Criterio	Compuerta 1: pasa a campo	Compuerta 2: pasa a la SAS
Potencia	Estimada de al menos [1 MW]	Recalculada con la caída validada, a menos de [15 %] de la estimada
TIR y capex	TIR sin financiación de al menos [12 %]; capex de máximo [USD 4.500 por kW]	TIR de al menos [12 %] en el caso base y [8 %] en el conservador (caudal −15 %, capex +20 %); capex de máximo [USD 4.500 por kW]
Conexión	Punto probable a máximo [15 km]	Sin restricción de capacidad informada por el operador de red
Ambiental y predial	Sin traslape con áreas protegidas, páramos u otras figuras de exclusión; tenencia clara o gestionable	Sin impedimento mayor informado por la CAR; al menos un contacto positivo con los propietarios
Decisión de EGyT	En 10 días hábiles; sin respuesta, el sitio no se activa y queda libre para Regenergy	En [90] días desde el informe del sitio; la SAS se constituye en los [30] días siguientes

Los umbrales entre corchetes son propuestos y se ajustan con EGyT.

INVERSIÓN · VALORES EN COP

Inversión y forma de pago

Precios tentativos, por verificar

ETAPA 1

187.000.000

10 sitios · compromiso firme

ETAPA 2

118.800.000

4 sitios (estimado), si se activa

TOTAL BASE ESTIMADO

305.800.000

Con IVA (19 %): 363.902.000

ESCENARIOS

Escenario	Antes de IVA	Total con IVA
Base: 4 sitios en la Etapa 2	305.800.000	363.902.000
2 sitios en la Etapa 2	250.400.000	297.976.000
6 sitios en la Etapa 2	361.200.000	429.828.000
4 sitios con aforo y geología	393.200.000	467.908.000

OPCIONALES POR SITIO

Aforo de caudal	**13.800.000**
Geología y geotecnia	**8.050.000**

FORMA DE PAGO

En cada etapa: 50 % al firmar o activar y 50 % al entregar el informe. Facturas a 10 días hábiles, más IVA.

CIERRE

Después del estudio y próximos pasos

DESPUÉS DEL ESTUDIO

Una SAS por proyecto

Socios. Cada sitio que califica en la Compuerta 2 se desarrolla en una SAS propia, con EGyT y Regenergy como socios.

Desarrollo. EGyT financia el presupuesto aprobado por la junta; Regenergy gerencia predios, licencia, concesión, conexión y contratación.

Hoja de ruta. De 3 a 7 años hasta construir: predios, conexión, licencia y concesión corren en paralelo a la factibilidad.

PRÓXIMOS PASOS

1. **Firmar la propuesta y el acuerdo marco**
   El acuerdo marco se firma antes de recibir coordenadas exactas o informes.

2. **Pagar el anticipo y enviar sus criterios**
   50 % de la Etapa 1 (COP 93.500.000, tentativo) al firmar; criterios de inversión (TIR objetivo y rango de tamaño) en 5 días hábiles.

3. **Recibir el informe de filtro**
   Etapa 1 en 8 semanas desde el anticipo y la información de EGyT.

Vigencia: hasta el 18 de noviembre de 2026

Regenergy Projects SAS · gerencia@regenergy-pro.com · +57 305 421 2200
